



Objekta novietojuma shēma

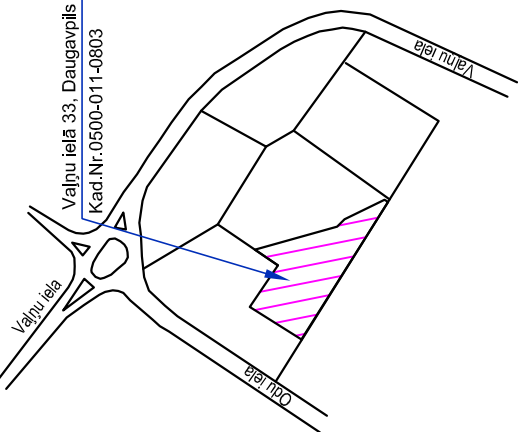

IZMANTOTO NORMATĪVO DOKUMENTU SARAKSTS

- LR "Būvniecības likums";
- MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi";
- MK noteikumi Nr.529 "Ēku būvnoteikumi";
- LEN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana";
- LEN 202-15 "Būvju ugunsdrošība";
- LEN 200-21 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs";
- LEN 405-21 "Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs";
- LEN 203-15 "Betona būvkonstrukciju projektēšana";
- LEN 204-14 "Tērauda būvkonstrukciju projektēšana";
- MK Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus";
- MK Nr. 143 "Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā";
- Darba aizsardzības likums;
- MK Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi";
- MK Nr.400 "Darba aizsardzības prasības drošības zīniju lietošana";
- Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.marta pieņemtos saistošos noteikumus Nr.3 "Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu.

SITUĀCIJAS PLĀNS

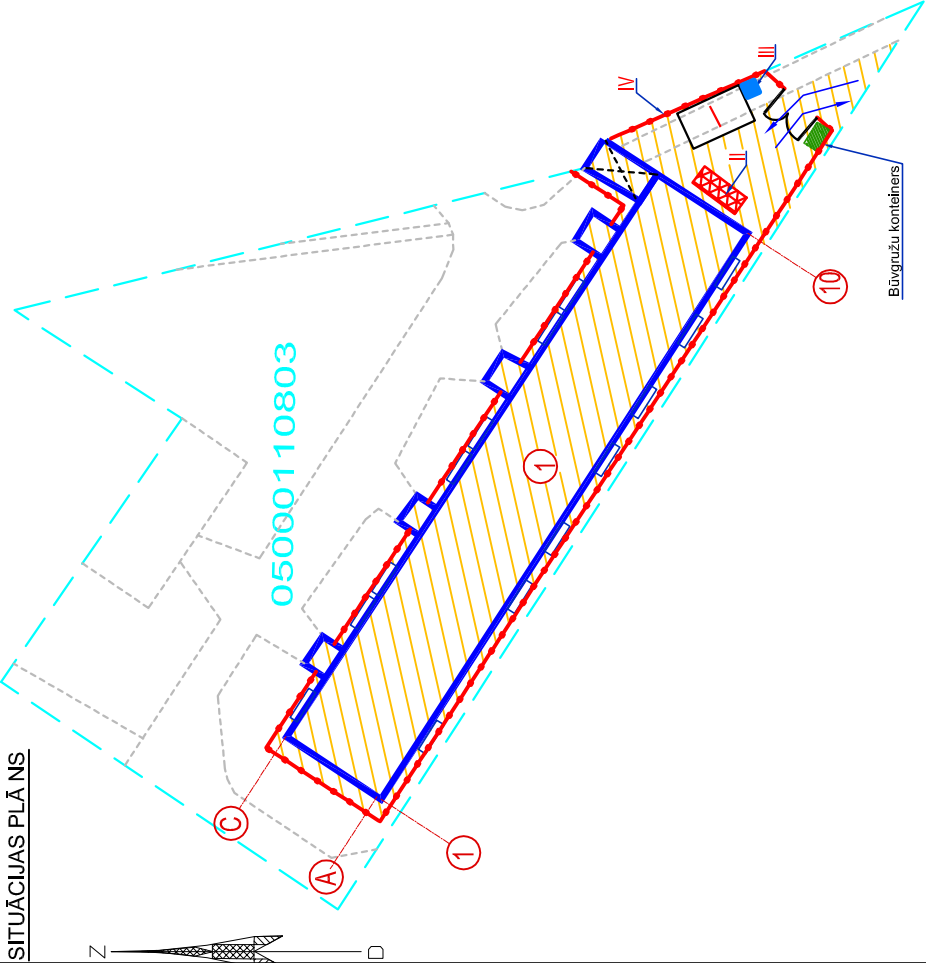

Ēku eksplikācija

Nr.p.k.	NOSAUKUMS	Piezīmes
	Zemes kadastra Nr. 0500-011-0803	zemes kopliātība 3022.0m2
1.	Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja	galvenais lietošanas veids - 112201

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

plānā	Nosaukums
	Pārvaldes ēka
	Pārveļojamu pagaidu vagoniņu uzstādīšanas vieta (sadrīves telpas, apsardze, darbu vadītājs, medpunkts)
	Būvgružu pagaidu glābšanas konteiners
	Materiālu nokraušanas vieta
	Bioluāle
	Būvlaukuma pagaidu nožogojums
	Ieejas aizsardzības jumiņš AJ
	Autotransporta kustības virziens
	Ugunsdzēsības stends

Darbu un materiālu apjomi

Poz.	Nosaukums	Tehniskais raksturojums	Mēra v – ba	Daudz.	Piezīmes
1	Administrācijas un strādnieku modulis	AXBxH 5,86x2,24x2,34	m ²	13,10	
2	Ugunsdzēsības inventāra stends	AXBxH 1,20x1,40x2,34	gab.	1	Lāpstas, spaiņi, ķekši, putu apraui
3	WC (bioluāletes)	V=8,5m3-A x B x H 4,09x1,75 x 1,5	gab.	1	
4	Būvgružu konteineri	BEKAERT vai analogi	p/m	160,0	
5	Būvlaukuma nožogojums		t	28*	
6	Orientiējošs būvniecības aktriumu apjoms		gb	4	
7	Aizsardzības jumiņš AJ				

Būvmehānismu raksturojums

Nosaukums	Izīces garums m	Izīces attālums m	Izīces pacel's. augstums m	Cel'spēja, t	
				uz balsta	bez balsta
Autoceltnis KS3577-3k	14+7	7.5	21	2.0	
Autotornis NISSAN "Cabstar"	-	14	16	0.6	

Pagaidu ēku un būvju eksplikācija

Nr p/k	Nosaukums	Mērvēdība	Daudz
I	Pārveļojamo pagaidu vagoniņu uzstādīšanas vieta	m2	25,00
II	Materiālu nokraušanas vieta	m2	12,0
III	Bioluāle	m2	1,5
IV	Pagaidu nožogojums	m	160,00*

Piezīmes:

1. PIRMS BŪVDARBA UZSĀKŠANAS UZSTĀDĪT PAGaidu BŪVLAUKUMA NOŽOGJUMU.
2. KOKA SPĀRU PACELŠANA JUMTA KONSTRUKCIJU ATJAUNOŠANĀ PAREDZĒTA AR AUTOCELTNĪ KS-3577.
3. BŪVMATERIĀLU PIEGĀDE UZ JUMTU PAREDZĒTA AR AUTOTORNĪ VAI CITU PACELŠANAS MEHĀNISMU (ELEKTRISKAMEHĀNISKA VINČA). AUTOTORNĀ/AUTOCELTNĀ IZVIETOŠANU UN NOŽOGŠANU, KĀ AR CITĀ MEHĀNISMA IERĪKOŠANU IZSTRĀDĀ BŪVUZŅĒMĒJS DVP PROJEKTĀ.
4. KONSTRUKCIJU MONTĀŽAS LAIKĀ IEVĪROT DROŠĪBAS TEHNIKAS NOTEIKUMUS ATBILSTOŠĪ "MK 2003.25.02 NOT. Nr.92 "DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS, VEICOT BŪVDARBUS".
5. GAR MĀJU Valņu ielā 33. IETEICAMS VEIDOT GĀJĒJU TUNELI.
6. BŪVDARBU VEIKŠANAS PROJEKTA BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNU, JA NEPIECIEŠAMS SASKAŅOT AR NEPIECIEŠAMĀM IESTĀDĒM. PAGaidu CELĀ SATIKSMES ORGANIZĀCIJU IZSTRĀDĀ BŪVUZŅĒMĒJS DVP PROJEKTĀ UN SASKAŅO AR NEPIECIEŠAMĀM IESTĀDĒM JA NEPIECIEŠAMS.
7. BŪVDARBU VEIKŠANAS GAITĀ NEPIELAUT BŪVĀJUMU NODARŠANU TREŠĀM PERSONĀM UN VIŅU ĪPAŠĀMĀM.
8. Pirms būvdarbu sākuma izsaukt SIA "Aircom", SIA "Baltcom" pārstāvjus esošos tīklus norādēt, kurus nepieciešams saglabāt un aizsargāt. Dz.mājas bānīņos un jumtā SIA "Tel" sakaru tīklu nav. Ir SIA "Tel" sakaru kanalizācijas ēvads pagrabā.
9. Dz. māja Valņu ielā 33, Daugavpils., zemes kad. apzīmējums: 05000110803 - atrodas SIA "Tel" sakaru kabeļu kanalizācijā, kā arī citi elektronisko sakaru tīkla elementi. Būvprojekktā nav paredzēta esošo sakaru tīklu pārvietošana, esošās augstuma atzīmes nav mainītas. Darbu veikšanas gaitā nodrošināt zemes gabalā un pieguļošajā teritorijā esošo SIA "Tel" elektronisko sakaru tīkla un ar to saistīto elementu aizsardzību, nepārtraukt darbību un piekļuvei elektronisko sakaru tīklam bojājumu novēršanas un uzturēšanas darbu veikšanai.
10. Visus darbus izpildīt ievērojot Latvijas būvnormatīvu, Latvijas standartu un citu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasības.

Lapu skaatīt kopā ar BK-2-1 "Jumta plāns-shēma ar esošo SAKARU tīkliem.

Būvprojekktā nav paredzēta esošo sakaru tīklu pārvietošana, esošās augstuma atzīmes nav mainītas. Darbu veikšanas gaitā nodrošināt zemes gabalā un pieguļošajā teritorijā esošo SIA "Tel" elektronisko sakaru tīkla un ar to saistīto elementu aizsardzību, nepārtraukt darbību un piekļuvei elektronisko sakaru tīklam bojājumu novēršanas un uzturēšanas darbu veikšanai.



Būvobjekta nosaukums		Būvprojekta nosaukums	
Dzīvojamās mājas Valņu ielā 33, Daugavpils, jumta seguma atjaunošana ar silināšanu, gala sienu silināšana un logu bloku koka ieliktnu nomaina ar silināšanu.		Dzīvojamās mājas Valņu ielā 33, Daugavpils, jumta seguma atjaunošana ar silināšanu.	
BŪVKOMERSANTA REGIST.Nr.2887 - R		Darbu organizēšanas shēma	
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
BK daļ. vad. V. Nikolajevs			
Izstrādāja N. Popkova			
Ath. reg.Nr. 9935			
Pasūtītāja Nr.		Darbu organizēšanas shēma	
Pasūtītājs: SIA "DMP"		Mērogs	
23-31-010		1:500	
Lapas Nr.		Lapu sk.	
