


Objekta novietojuma shēma

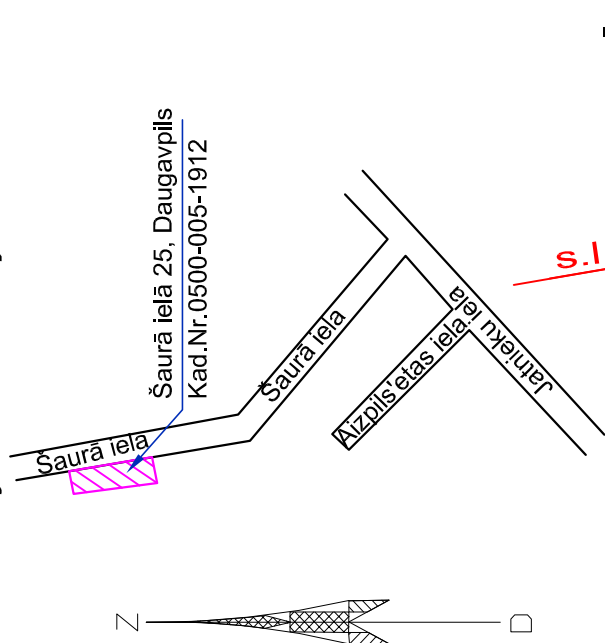

SITUĀCIJAS PLĀNS

Darbu un materiālu apjomi

Poz.	Nosaukums	Tehniskais raksturojums	Mēra v - ba	Daudz.	Piezīmes
1	Administrācijas un strādnieku modulis	AxBxH 5,86x2,24x2,34,	m ²	13.10	
2	Ugunsdzēsības inventāra stends		gab.	1	Lāpstas, spauņi, ķekši, putu aparāti
3	WC (biotualetes)	AxBxH 1,20x1,40x2,34,	gab.	1	
4	Būvgružu konteineri	V=8,5m ³ -A x B x H 4,09x1,75 x 1,5	gab.	1	
5	Būvlienkuma nožogojums	BEKAERT vai analogi	p/m	70.0	
6	Orientējošs būvniecības atkritumu apoms		m ³	9.00	

IZMANTOTO NORMATĪVO DOKUMENTU SARAKSTS

- LR "Būvniecības likums";
- Mk noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi";
- Mk noteikumi Nr.529 "Ēku būvnoteikumi";
- LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana";
- LBN 202-15 "Būviju ugunsdrošība";
- LBN 200-21 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs";
- LBN 405-21 "Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs";
- LBN 203-15 "Betona būvkonstrukciju projektēšana";
- LBN 204-14 "Tērauda būvkonstrukciju projektēšana";
- MK Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;
- MK Nr. 143 "Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”;
- Darba aizsardzības likums;
- MK Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi”;
- MK. Nr.400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīniju lietošanā”;
- Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.martā pieņemtos saistošos noteikumus Nr.5 "Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritoriju apsargu un būvju uzturēšanu.

Piezīmes:

1. PIRMS BŪVDARBA UZSAKŠANAS UZSTĀDĪT PAGaidu BŪVLAUKUMA NOŽOGUJUMU.
UN DEMONTĒŠANU VEIKT PĒC DARBU VEIKŠANAS SECĪBU.
2. KONSTRUKCIJU MONTĀŽAS LAIKA IEVIEROT DROŠĪBAS TEHNIKAS NOTEIKUMUS ATBILSTOŠI "MK 2003.25.02 NOT. Nr.92 "DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS, VEICOT BŪVDARBUS".
3. BŪVDARBU VEIKŠANAS PROJEKTA BŪVDARBU ĢENERĀLPĀĻŅU, JA NEPIECIEŠAMS SASKAŅOT AR NEPIECIEŠAMĀM IESTĀDĒM. PAGaidu CEĻA SATIKSMES ORGANIZĀCIJU IZSTRĀDĀ BŪVUZŅIEMEJS DVP PROJEKTĀ UN SASKAŅO AR NEPIECIEŠAMĀM IESTĀDĒM (JA NEPIECIEŠAMS). BŪVDARBU VEIKŠANAS GAITĀ NEPIELAUT BOJĀJUMU NODARĪŠANU TREŠĀM PERSONĀM UN VIŅU ĪPAŠUMĀM.
4. PĒC BŪVDARBU PABEIGŠANAS ATJAUNOT ESOŠO LABIEKĀRTOŠANU.

4. PĒC BŪVDARBU PABEIGŠANAS ATJAUNOT ESOŠO LABIEKĀRTOŠANU.

5. Pirms būvdarbu sākuma izsaukt SIA "Aircom", SIA "Baltcom", SIA "TET" pārstāvjus esošos tīklus norādei, kurus nepieciešams saglabāt un aizsargāt.

DARBA AIZSARDĪBAS INVENTĀRA STENDA SHĒMA

MB:M



Projektiņā paredzēta SIA "TET" esošo sakaru tīklu pārvietošana, esošās augstuma atzīmes nemainās. Cokola izolācija tiek veikta līdz zemes līmenim. SIA "TET" elektronisko sakaru tīkla aizsargoslāņi netiek veikti zemes darbi.

Ēku eksplikācija

Nr.p.k.	NOSAUKUMS	Piezīmes
	Zemes gabals ar kad.num. 05000051912	zemes koplātība 3749,0m2
1.	Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja	galvenais ietošanas veids - 112201

Pagaidu ēku un būvju eksplikācija

Nr p/k	Nosaukums	Mērvērtība	Daudz
I	Pārvietojamo pagaidu vagoniņu uzstādīšanas vieta	m2	13.1
II	Materiālu nokrauššanas vieta	m2	12.0
III	Biotualetes	m2	1.68
IV	Pagaidu nožogojums	m	~70.00
V	Sastatni	m2	~170.00

Būvmehānismu raksturojums

Nosaukums	Izīces garums m	Izīces attālums m	Izīces pacelš. augstums m	Celtspēja, t	
				uz balsta	bez balsta
Autoceltis KS3577-3k	14+7	7.5 14	21 16	2.0 0.6	
Autotornis NISSAN "Cabstar"	-	-	-	-	-

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

Apzīmējums plānā	Nosaukums
	Daudzīvokļu dzīvojamā māja
	Pārveotamu pagaidu vagoniņu uzstādīšanas vieta (sadzīves telpas, apsarde, darbu vadītājs, medpunkts)
	Būvgružu pagaidu glābšanas konteiners
	Materiālu nokraušanas vieta
	Biotoalete
	Būvlaukuma pagaidu nožogojums
	Cauruļ sastatnes
	Autotransporta kustības virziens
	Ugunsdzēsības stends

KOMUNĀLPROJEKTS Daugavpils nodaļa BŪVKOMERSANTA REĢISTR.Nr.:2687 - R Būvobjekta nosaukums Dzīvojamās mājas Šaurā ielā 25, Daugavpilī, gala sienu siltināšana un balkonu atjaunošana					
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	1. kārtā	Dzīvojamās mājas Šaurā ielā 25., Daugavpilī, gala sienu siltināšana.
				Lapas saturs	
BK daļ. vad.	V. Nikolajevs		01.2024	Pasūtījuma Nr.	24-31-001
Izstrādāja	N. Popkova		01.2024	Pasūtītājs:	SIA "DMP"
Arh. reg.Nr.	9943				Mērogs 1:500
					Stadija -
					Lapas Nr. Lapu sk.
