
Objekta novietojuma shēma

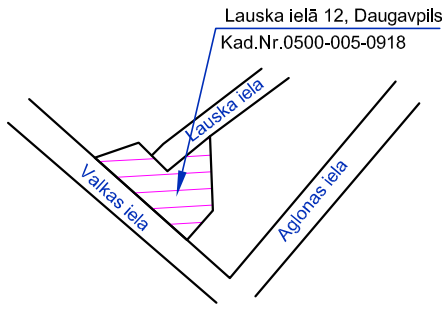

IZMANTOTO NORMATĪVO DOKUMENTU SARAKSTS

-LR "Būvniecības likums";
-Mk noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi";
-Mk noteikumi Nr.529 "Ēku būvnoteikumi";
-LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana";
-LBN 202-15 "Būvju ugunsdrošība";
-LBN 200-21 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs";
-LBN 405-21 "Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs";
-LBN 203-15 "Betona būvkonstrukciju projektēšana";
-LBN 204-14 "Tērauda būvkonstrukciju projektēšana";
-MK Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus";
-MK Nr. 143 "Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā";
-Darba aizsardzības likums;
-MK Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi";
-MK. Nr.400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā";
-Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.martā pieņemtos saistošos noteikumus Nr.5 "Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu.


Ēku eksplikācija

Nr.p.k.	NOSAUKUMS	Piezīmes
	Zemes kad.Nr.0500-005-0918	zemes kopplātība 2967.0m2
1.	Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja	galvenais lietošanas veids - 112201

Darbu un materiālu apjomi

Poz.	Nosaukums	Tehniskais raksturojums	Mēra v - ba	Daudz.	Piezīmes
1	Administrācijas un strādnieku modulis	AxBxH 5.86x2.24x2.34,	m^2	13.10	
2	Ugunsdzēsības inventāra stends		gab.	1	Lāpstas, spaiņi, ķekši, putu aparāti
3	WC (biotualetes)	AxBxH 1.20x1.40x2.34,	gab.	1	
4	Būvgružu konteineri	V=8.5m3-A x B x H 4.09x1.75 x 1.5	gab.	1	
5	Būvlaukuma nožogojums	BEKAERT vai analogi	p/m	190.0	
6	Orientējošs būvniecības atkritumu apjoms		t	28*	
7	Aizsardzības jumtiņš AJ		gb	4	

SITUĀCIJAS PLĀNS

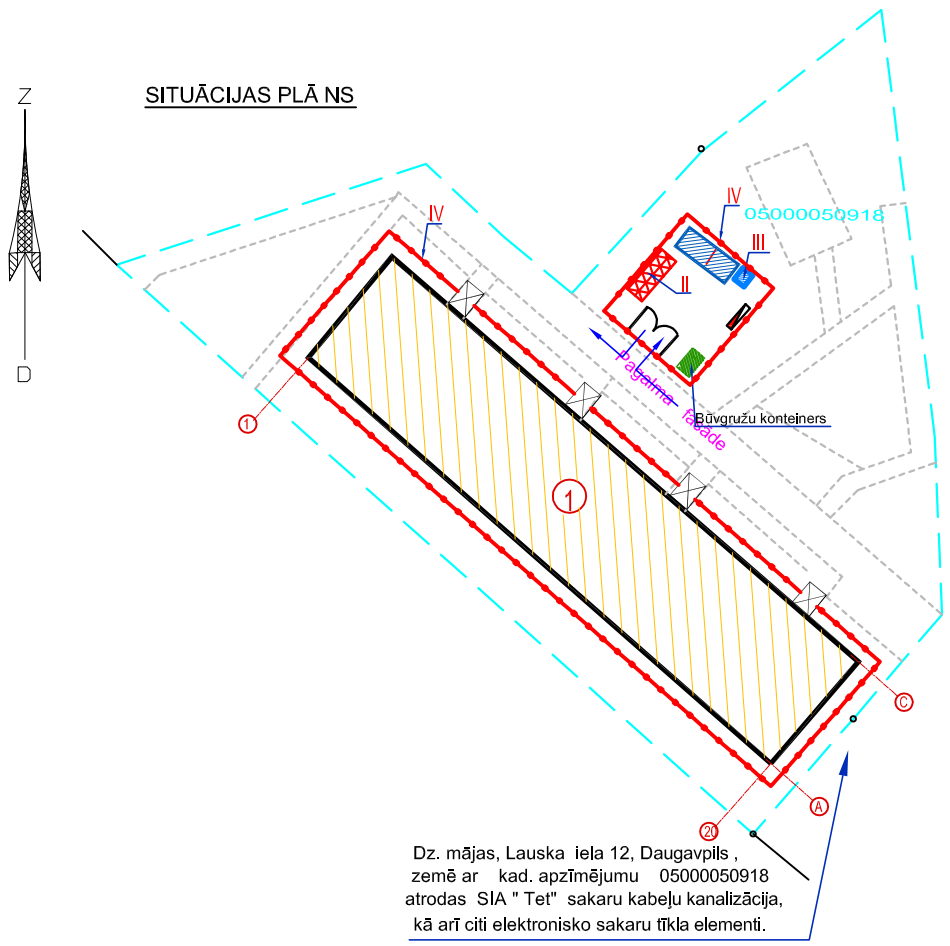

Dz. mājas, Lauska iela 12, Daugavpils ,
zemē ar kad. apzīmējumu 05000050918
atrodas SIA " Tet" sakaru kabeļu kanalizācija,
kā arī citi elektronisko sakaru tīkla elementi.

Projektā nav paredzēta SIA "Tet" esošo sakaru tīklu pārvietošana, esošās augstuma atzīmes nemainās. Cokola izolācija tiek veikta līdz zemes līmenim.
SIA "Tet" elektronisko sakaru tīkla aizsargjoslā netiek veikti zemes darbi.

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

plānā	Nosaukums GARENGULBAĻĶIS
	Pārvaldes ēka
	Pārvietojamu pagaidu vagoniņu uzstādīšanas vieta (sadzīves telpas, apsardze, darbu vadītājs, medpunkts)
	Būvgružu pagaidu glābšanas konteiners
	Materiālu nokraušanas vieta
	Biotualete
	Būvlaukuma pagaidu nožogojums
	Ieejas aizsardzības jumtiņš AJ
	Autotransporta kustības virziens
	Ugunsdzēsības stends

Būvmehānismu raksturojums

Nosaukums	Izlices garums m	Izlices att'alums m	Izlices pacel's. augstums m	Celtsp'eja, t	
				uz balsta	bez balsta
Autoceltnis KS3577-3k	14+7	7.5 14	21 16	2.0 0.6	
Autotornis NISSAN "Cabstar"	-	-	-	-	-

Pagaidu ēku un būvju eksplikācija

Nr p/k	Nosaukums	Mērvedība	Daudz
I	Pārvietojamo pagaidu vagoniņu uzstādīšanas vieta	m2	25.00
II	Materiālu nokraušanas vieta	m2	12.0
III	Biotualete	m2	1.5
IV	Pagaidu nožogojums	m	190.00*

Piezīmes:


1. PIRMS BŪVDARBA UZSAKŠANAS UZSTĀDĪT PAGAIDU BŪVLAUKUMA NOŽOGOJUMU.
2. KOKA SPĀRU PACELŠANA JUMTA KONSTRUKCIJU ATJAUNOŠANAI PAREDZĒTA AR AUTOCELTŅI KS-3577.
3. BUVMATERIĀLU PIEGĀDE UZ JUMTU PAREDZĒTA AR AUTOTORŅI VAI CITU PACELŠANAS MEHĀNISMU (ELEKTRISKA/MEHĀNISKA VINČA). AUTOTORŅA/AUTOCELTŅA IZVIETOŠANU UN NOŽOGOŠANU, KĀ ARĪ CITA MEHĀNISMA IERĪKOŠANU IZSTRĀDĀ BŪVUZŅĒMĒJS DVP PROJEKTĀ.
4. KONSTRUKCIJU MONTĀŽAS LAIKA IEVIEROT DROŠĪBAS TEHNIKAS NOTEIKUMUS ATBILSTOŠI "MK 2003.25.02 NOT. Nr.92 "DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS, VEICOT BŪVDARBUS".
5. GAR MĀJU Lauska ielā 12, IETEICAMS VEIDOT GĀJĒJU TUNELI.
6. BŪVDARBU VEIKŠANAS PROJEKTA BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNU, JA NEPIECIEŠAMS SASKAŅOT AR NEPIECIEŠAMĀM IESTĀDĒM. PAGAIDU CEĻA SATIKSMES ORGANIZĀCIJU IZSTRĀDĀ BŪVUZŅĒMEJS DVP PROJEKTĀ UN SASKAŅO AR NEPIECIEŠAMĀM IESTĀDĒM (JA NEPIECIEŠAMS). BŪVDARBU VEIKŠANAS GAITĀ NEPIEĻAUT BOJĀJUMU NODARĪŠANU TREŠJĀM PERSONĀM UN VIŅU ĪPAŠUMĀM.
7. PĒC BŪVDARBU PABEIGŠANAS ATJAUNOT ESOŠO LABIEKĀRTOŠANU.
8. Pirms būvdarbu sākuma izsaukt SIA"Aircom, SIA "Baltcom" pārstāvjus esošos tīklus norādei, kurus nepieciešams saglabāt un aizsargāt.
9. Dz. māja, Lauska iela 12, Daugavpils , zemes kad. apzīmējums: 0500-005-0918- atrodas SIA " Tet" sakaru kabeļu kanalizācija, kā arī citi elektronisko sakaru tīkla elementi.
 Būvprojektā nav paredzēta esošo sakaru tīklu pārvietošana, esošās augstuma atzīmes nav mainītas. Darbu veikšanas gaitā nodrošināt zemes gabalā un pieguļošajā teritorijā esošo SIA"Tet" elektronisko sakaru tīkla un ar to saistīto elementu aizsardzību , nepārtrauktu darbību un piekļuvi elektronisko sakaru tīklam bojājumu novēršanas un uzturēšanas darbu veikšanai.
10. Visus darbus izpildīt ievērojot Latvijas būvnormatīvu, Latvijas standartu un citu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasības.

Lapu skatīt kopā ar BK-2-1 "Jumta plāns-shēma ar esošo SAKARU tīkliem.


DARBA AIZSARDZĪBAS INVENTĀRA STENDA SHĒMA
M B:M




AIZSARDZĪBAS JUMTIŅA AJ (6 gb)
KONSTRUKCIJA
M 1:50

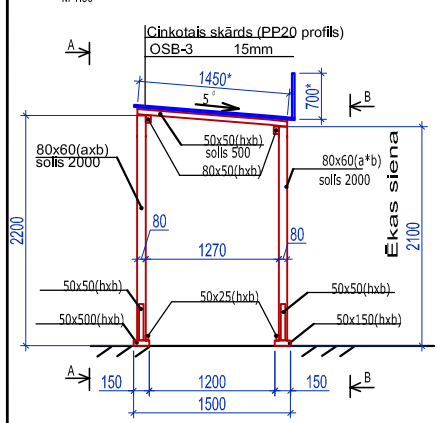


GRIEZUMS "A-A"
M 1:50

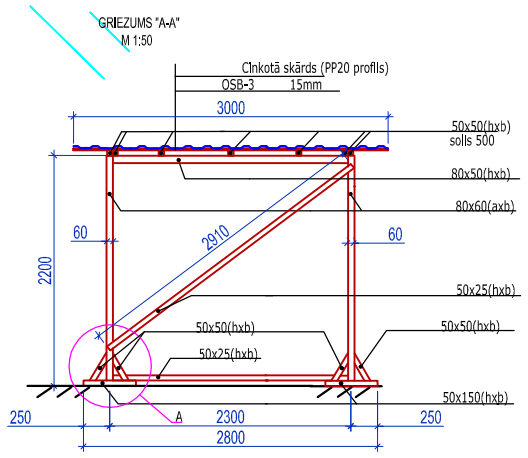

GRIEZUMS "B-B"
M 1:50

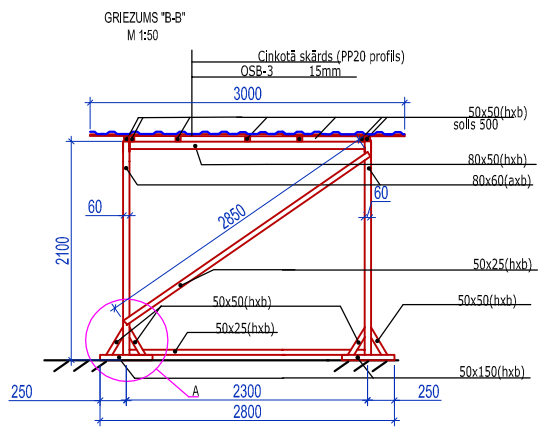

MEZGLS "A"
M 1:20

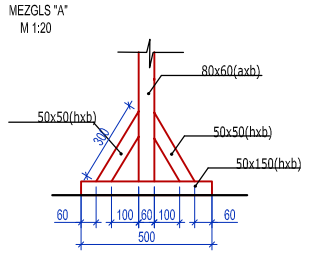

KOMUNALPROJEKTS Daugavpils nodaļa BŪVKOMERSANTA REĢISTR.Nr.2687 - R				Būvobjekta nosaukums: Dzīvojamās mājas Lauska ielā 12, Daugavpilī, jumta seguma atjaunošana ar siltināšanu, gala sienu siltināšana un logu bloku koka ieliktņu nomaiņa ar siltināšanu.					
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	1. kārta	Dzīvojamās mājas Lauska ielā 12, Daugavpilī, jumta seguma atjaunošana ar siltināšanu				
				Lapas saturs	Darbu organizēšanas shēma				
BK daļ. vad.	V. Nikolajevs		01.2024	Pasūtījuma Nr.	23-31-015			Mērogs	Stadija
Izstrādāja	N. Popkova		01.2024	Pasūtītājs: SIA "DMP"				1:500	-
Arh. reg.Nr.	9941							Lapas Nr.	Lapu sk.
